

ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน เมษายน 2565
ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 4 ของการดำเนินโครงการฯ)



ความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาตามสัญญา

: ๑,๐๒๐ วัน

ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว

: ๑๑๑ วัน (ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Barrette Pile)
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ


กิจกรรมร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

12

รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน (Progress Photograph)


ZONE 1 (L)

งานเตรียมพื้นที่



ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

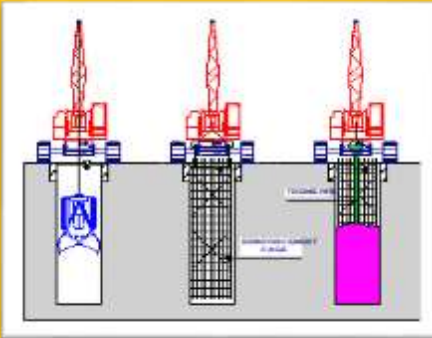

MLP01-03 งาน Guide Wall



MLP02-04 งาน Guide Wall



MLP01-07 งาน Guide Wall



LP01-03 งาน Guide Wall




MLP02-04 งาน Guide Wall



MLP02-10 งาน Guide Wall

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

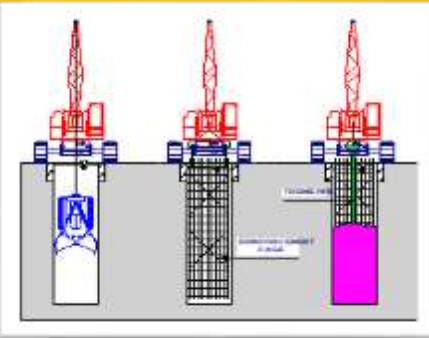

MLP01-09 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-16 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-16 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-18 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile




MLP01-19 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-21งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

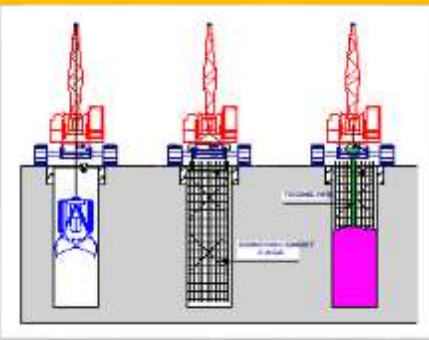

MLP01-21 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-22 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-22 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-24 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile




MLP01-24 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-27 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

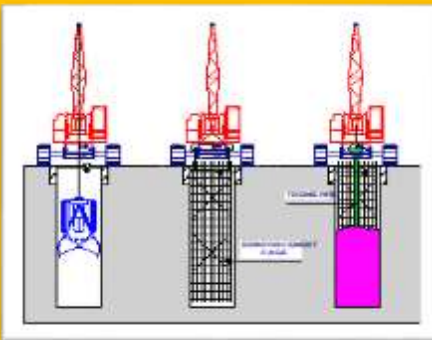

MLP01-04 งาน Drilling monitoring



MLP01-18 งาน Drilling monitoring



MLP01-21 งาน Drilling monitoring



MLP01-16 ทำความสะอาดหลุมเจาะ
(De-sanding)




MLP01-19 ทำความสะอาดหลุมเจาะ
(De-sanding)



MLP01-23 ทำความสะอาดหลุมเจาะ
(De-sanding)

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

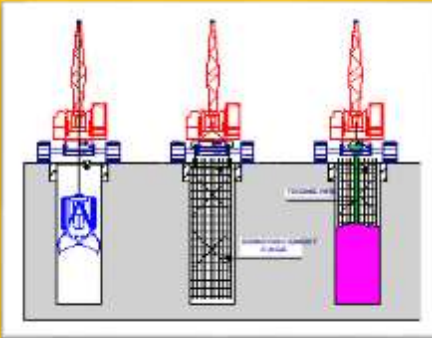

MLP01-16 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-18งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-19 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-20 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม




MLP01-24 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-24 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

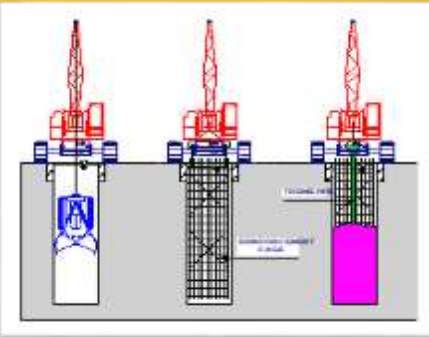

MLPO1-09 ติดตั้ง tremie pipe



MLPO1-04 ติดตั้ง tremie pipe



MLPO1-16 งานเทคอนกรีต Barrette Pile



MLPO1-17 งานเทคอนกรีต Barrette Pile




MLPO1-19 งานเทคอนกรีต Barrette Pile



MLPO1-22 งานเทคอนกรีต Barrette Pile

ZONE 1 (C)

งานรื้อถอนเสาเข็ม
 ป้าย Overhang
 บริเวณ MLP01-07

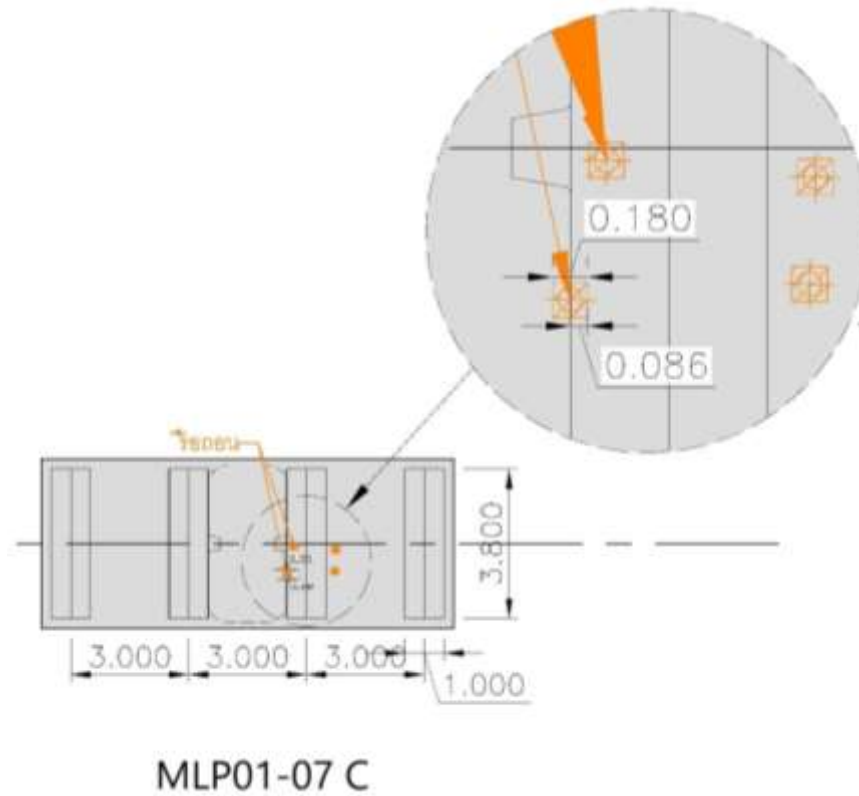

ZONE 2

งานขุดสำรวจ
 โครงสร้าง
 สะพานต่างระดับ
 บางขุนเทียน



MLP03-



MLP03-11



MLP03-12

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-19 (1)

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-19 (2)

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP4-23 (1)

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP4-23 (2)

ZONE 3




งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile EGAT#2 (1)

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile EGAT#2 (2)

ZONE 3

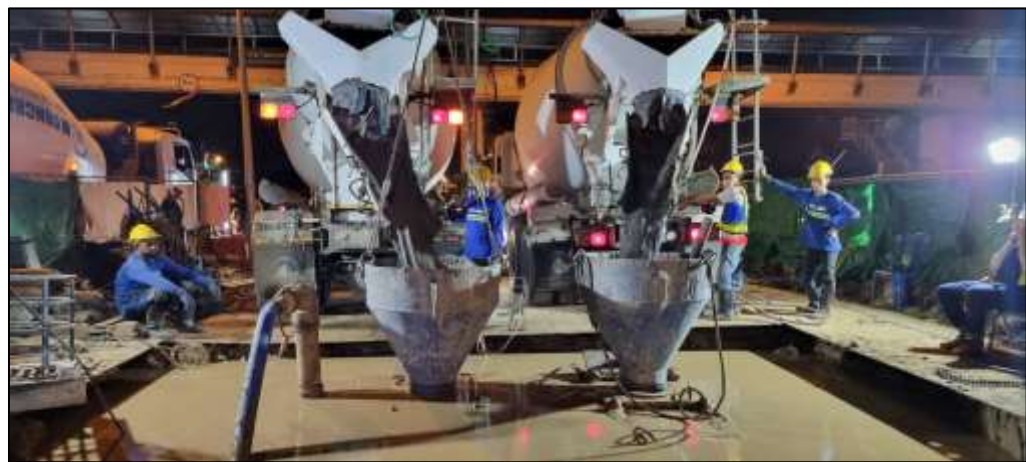

งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP05-06 (1)

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-27 (3)

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-19

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-23

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-27

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-32

ZONE 3




งานหล่อ Guide wall MLP04-34

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP05-01

ZONE 3

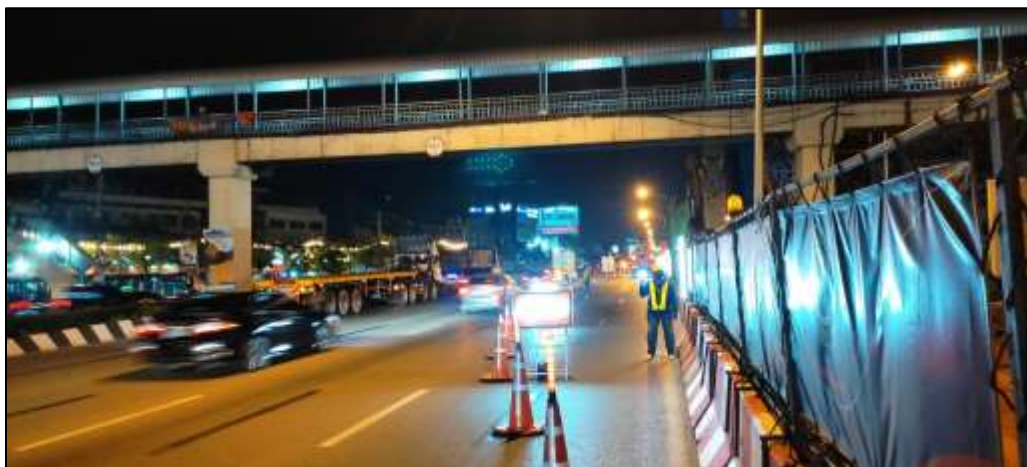

งานปิดเบี่ยงจราจร

ZONE 3



กิจกรรมด้านความปลอดภัย

ZONE 3



กิจกรรมด้านความปลอดภัย

4.1.1) กรมทางหลวง

งานรื้อย้าย Barrier ของกรมทางหลวง บริเวณเกาะ Separator



4.2.1) การไฟฟ้านครหลวง

สรุปความก้าวหน้างานไฟฟ้า



ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	การไฟฟ้านครหลวง					
	Sta..2+675.00 – 2+775.00 (RT) (กม.10+325.000 – 10+225.00)	เสา-สายไฟฟ้า 69 kV.	ประชุมและสำรวจตำแหน่งเสา-สายไฟฟ้า 69 kV. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน , การทางพิเศษฯ , ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC			
	Sta.3+900.00 (LT) (กม.9+100.00)	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	อยู่ระหว่างประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการควบคุมงานปรับแบบรูป			
	Sta. 4+670.00 – 5+100.00 (LT) (กม.8+330.00 – 7+900.00)	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	อยู่ระหว่างการสำรวจแนวไฟฟ้าใต้ดินและจัดทำแบบรูปเพื่อขออนุญาต กฟน ดำเนินการ			
	Sta. 5+100.00 (Cross) (กม.7+900.00)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน		สำรวจท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่ กฟพ., ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง , กฟน. เขตบางขุนเทียน และ UN-CC (MLP05-03 to MLP05-04)		
	Sta.5+200.00 (กม.7+800.00)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV.	ประชุมและสำรวจหน้างานแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV. ได้แก่แนวสายส่ง EGAT และ การประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่องข้อควรระวังในการปฏิบัติงานก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน , การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบำรุงรักษาสายส่งใต้ดิน, การทางพิเศษฯ , ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC			

4.2.2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูง



ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)		1. นำส่งแผนการก่อสร้างฐานราก สำหรับติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 2. ประชุมประสานงานเรื่องแผนการดับกระแสไฟฟ้าระหว่างงานเจาะเข็มฐานราก ได้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (ZONE 3) ร่วมกับการทางพิเศษฯ , ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC	-		
	Sta. 5+200.00 (Cross) (กม.7+800.00)	EGAT 230 kV. 2 วงจร				
	Sta. 5+200.00 (Cross) (กม.7+800.00)	EGAT 230 kV. 1 วงจร				

4.2.3) การประปานครหลวง (กปน.)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปา



ที่	รายการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	การประปานครหลวง		ได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่อประปา บริเวณถนนพระราม 2 จากซอยพระราม 2 ซอย 54 ถึงซอย 72			
	- งานออกแบบรื้อย้ายแนวท่อประปา ขนาด 1000 มม. Sta. 4+200.00 – 4+260.00 (RT) (กม.8+800.00 – 8+740.00)	1 จุด	อยู่ระหว่างการปรับแก้รูปแบบแนววางท่อประปา 1000 มม. บริเวณคลองลาดลำภู เพื่อส่งผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณารูปแบบ	-	-	
	- งานขุดสำรวจแนวท่อประปา Sta. 1+080.346 – 6+249.090 (กม.11+919.654 – 1+750.910)	78 จุด	งานขุดสำรวจแนวท่อประปาขนาด ศก. 1000 มม. (เพิ่มเติม 8 จุด)	-	49 จุด (63%)	คงเหลือ 29 จุด

4.2.4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อก๊าซ



ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		-	ได้รับหนังสืออนุญาตให้การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก่อสร้างฐานรากเสา Monopole ในเขตระบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ		(เผื่อระวัง)
	Sta. 5+240.00 (Cross) (กม.7+780.00)	แนวท่อก๊าซ				

4.2.5) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายเสา-สายสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 National Telecom Public Company Limited **TOT CAT**

ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	หน่วยงานสื่อสาร					
	Sta. 1+650.00 – 1+800.00 (RT) (กม.11+350.00 – 11+200.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 1+650.00 (Cross) (กม.11+350.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 2+500.00 – 2+900.00 (RT) (กม.10+500.00 – 10+100.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 3+650.00 – 5+100.00 (RT) (กม.9+350.00 – 7+900.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 3+720 (Cross) กม.9+280.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 4+450 (Cross) (กม.8+550.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 6+130.00 (Cross) (กม.6+870.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 4+780.00 (Cross) (กม.8+220.00)	สายสื่อสารอากาศ				
	Sta. 4+300.00 – 4+400.00 (กม.8+700.00 – 8+600.00)	สำรวจแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน	1 จุด	11 จุด	12 จุด	

กิจกรรม : ล้างทำความสะอาด Barrier และทำความสะอาดไฟส่องสว่าง

ZONE 1



ปิดจราจรช่องทางหลัก ผังขาออก ทล.35 กม.10+775

กิจกรรม : แก้ไข Barrier Plastic และไฟส่องสว่าง

ZONE 1

แก้ไข Barrier Plastic
 พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 จุดแนวปะทะหัวเกาะกลางทางหลัก
 บนสะพานต่างระดับฯ ผังขาออก



แก้ไขไฟส่องสว่างตลอดเวลาแนว



กิจกรรม : ติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มเติม ก่อนถึงจุดแนวปะทะ Barrier Concrete

ZONE 1



เกาะกลางทางหลัก ช่วงเชิงลาดต่างระดับบางขุนเทียน ผังขาออก

กิจกรรม : ขนส่งชิ้นงาน Guide Wall และเปิด Barrier Concrete เปลี่ยนเป็น Barrier Plastic

ZONE 1



จัดจราจรร่วมกับผู้รับเหมา กรมทางหลวง ปิดจราจรช่องทางหลักฝั่งขาเข้า ทล.35 กม. 13+000

กิจกรรม : เพิ่มช่องจราจร บริเวณปากซอย 82 (ทางเข้า สน.แสมดำ)

ZONE 1



ขยับแนว Barrier Concrete เกาะกลางคูขนานฝั่งขาเข้าด้านช่องทางคูขนาน

กิจกรรม : งานสกัดลบเส้นแบ่งช่องจราจร

ZONE 2



ปิดช่องจราจรช่องทางหลัก ฟังชาออก กม.8+200 (ช่องทางออกการเคหะฯ ธนบุรี)
