



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1



ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน มกราคม 2566
ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 13 ของการดำเนินโครงการฯ)



กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2566

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาตามสัญญา : 1020 วัน
ระยะเวลาที่ดำเนินการ
แล้ว : 387 วัน (ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Barrette Pile)
- งานฐานราก (Footing)
- งานหล่อ Viaduct Segment
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

[illegible]

สรุปกำลังคน (Manpower) ประจำเดือน

พื้นที่	วิศวกร	โพรแมน+คนงาน	รวม
Zone 1	6	118	124
Zone 2	7	83	90
Zone 3	9	138	147
รวมทั้งหมด	22	339	361

รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน (Progress Photograph)


ZONE 1

งานปรับพื้นที่
ฝังขวาทาง
(เกาะ Separator)



ZONE 1

งานก่อสร้าง Barrette Pile

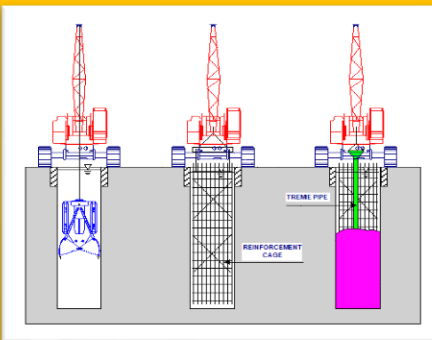

Guide wall MLP01-06 R



Guide wall MLP01-08 R





Guide wall MLP01-05 R



Guide wall MLP01-15 R

ZONE 1

งานก่อสร้าง Barrette Pile

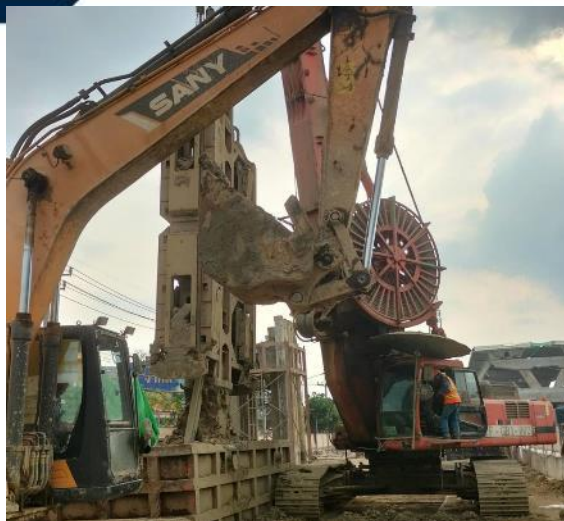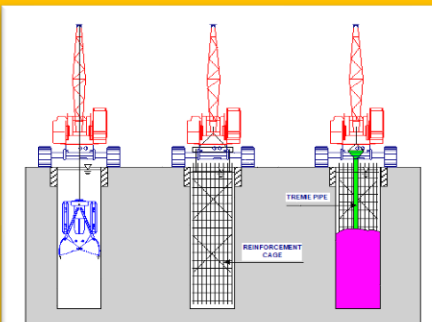

MLP1-09R งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-09 R งานเทคอนกรีต Barrette Pile





MLP01-08Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-08 R งานเทคอนกรีต Barrette Pile

ZONE 1

งานก่อสร้าง Barrette Pile

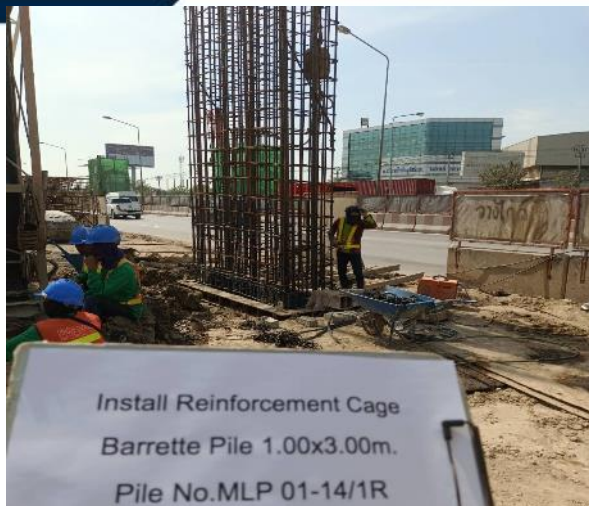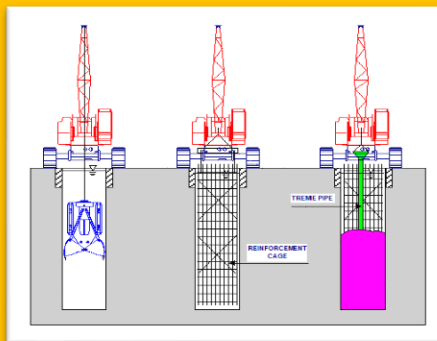

MLP01-14Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-14 R งานเทคอนกรีต
Barrette Pile





MLP01-12 Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-12 R งานเทคอนกรีต
Barrette Pile

ZONE 1

งานก่อสร้าง Barrette Pile

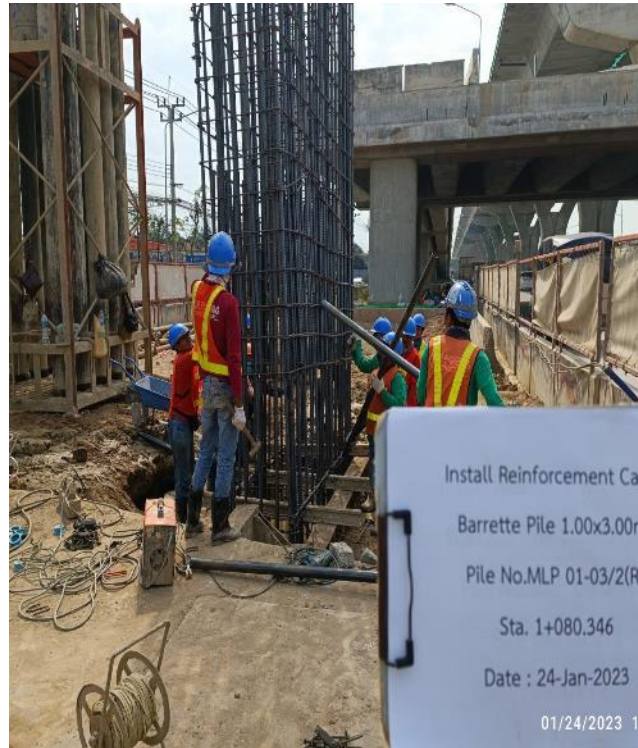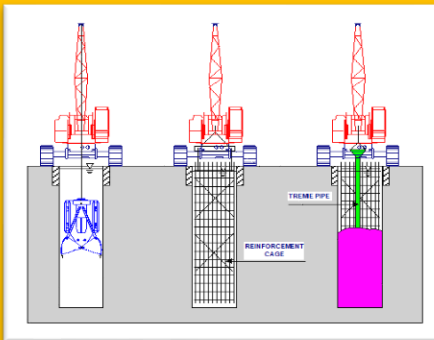

MLP01-03 Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม




MLP01-12Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-18 Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม

ZONE 1

งานก่อสร้าง Barrette Pile

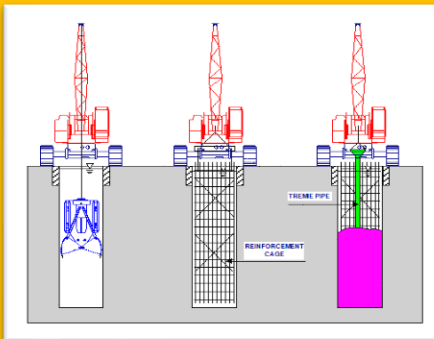


MLP01-13 R งานเทคอนกรีต Barrette Pile



MLP01-17 R งานเทคอนกรีต
Barrette Pile

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 ฐานราก

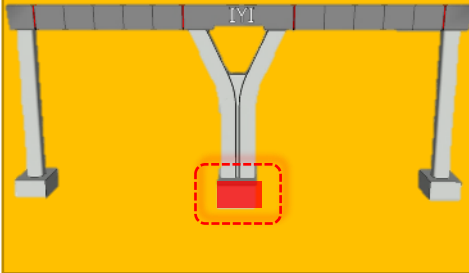


MLP01-06 Pile Cut Off



MLP01-06 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมงานฐานราก

ZONE 1


งานก่อสร้าง
ฐานราก

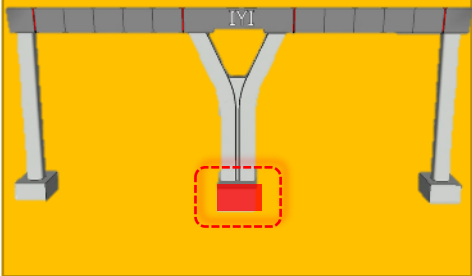

MLP01-06 งานเทคอนกรีตฐานราก

ZONE 1

งานก่อสร้าง
ฐานราก

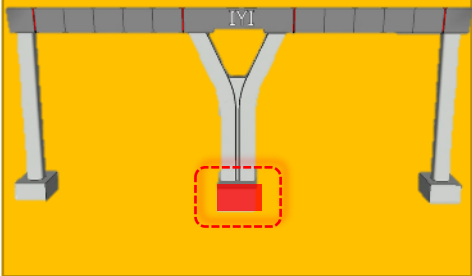


MLP01-11 งานขุดดินฐานราก



MLP01-11 Pile Cut Off

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 ฐานราก

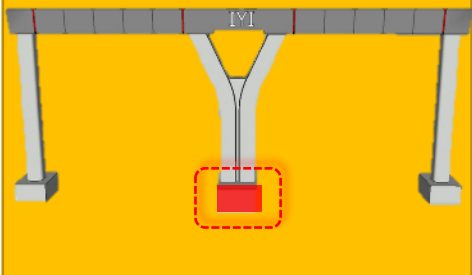


MLP01-15 Pile Cut Off



MLP01-15 งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก

ZONE 1


งานก่อสร้าง
 ฐานราก



MLP01-18L งานปัก Sheet Pile และ ติดตั้ง Bracing

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 ฐานราก

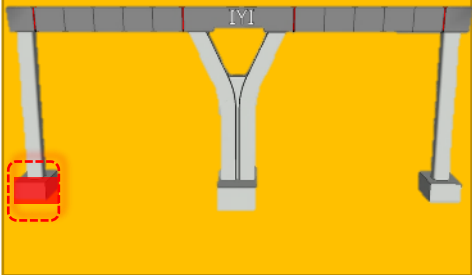


MLP01-15L งานปัก Sheet Pileและ ติดตั้ง Bracing



MLP01-15L Pile Cut Off

ZONE 1

งานก่อสร้าง
ฐานราก

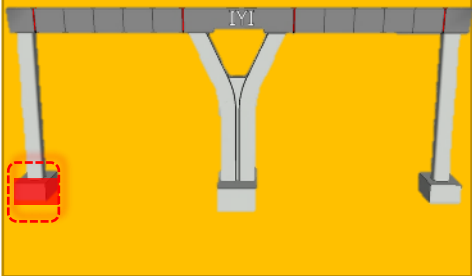

MLP01-16L งานขุดดินฐานราก



MLP01-16L งานขุดดินฐานราก




MLP01-16L Pile Cut Off



ZONE 1

งานก่อสร้าง ฐานราก

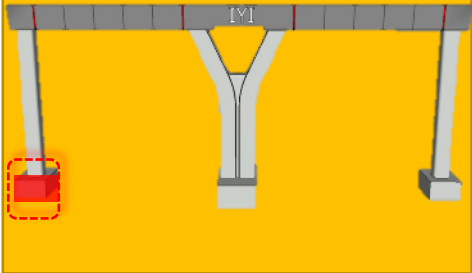


MLP01-17L งานปัก Sheet Pile และ ติดตั้ง Bracing



MLP01-17L Pile Cut Off

ZONE 1


งานก่อสร้าง ฐานราก

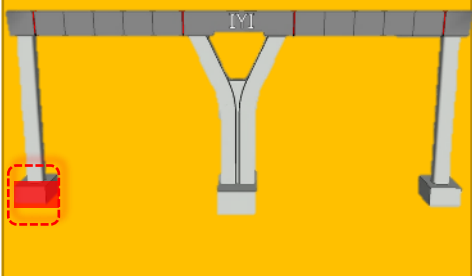

MLP01-21L งานปัก Sheet Pile
และ ติดตั้ง Bracing




MLP01-21L Pile Cut Off

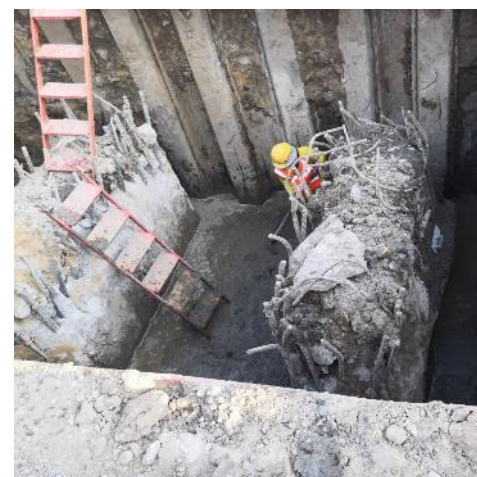

MLP01-21L งานเทลิ้นคอนกรีตฐานราก

ZONE 1

งานก่อสร้าง
ฐานราก

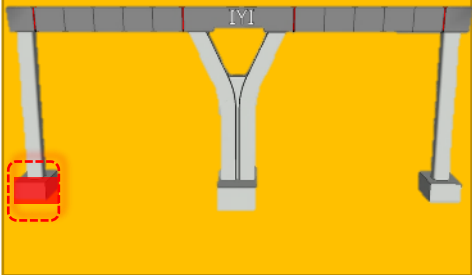


MLP01-08L งานปัก Sheet Pile
และ ติดตั้ง Bracing



MLP01-23L งานปัก Sheet Pile และ ติดตั้ง Bracing

ZONE 1

งานก่อสร้าง
ฐานราก

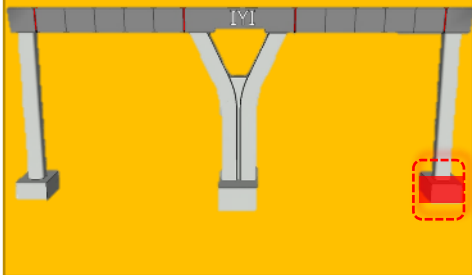


MLP01-22 R งานขุดดินฐานราก



MLP01-22 R Pile Cut Off

ZONE 1


งานก่อสร้าง
ฐานราก

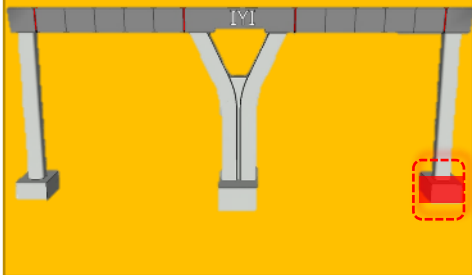

MLP01-23 R Pile Cut Off

ZONE 1

งานก่อสร้าง
 Column




MLP01-18
 งานรื้อถอน Sheet Pile



MLP01-20
 ติดตั้ง Formwork Column Step2

ZONE 1


งานก่อสร้าง
 Column

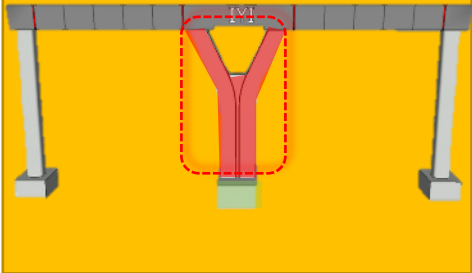

MLP01-21 งานติดตั้ง Formwork Column Step2

ZONE 1



งานก่อสร้าง
Column

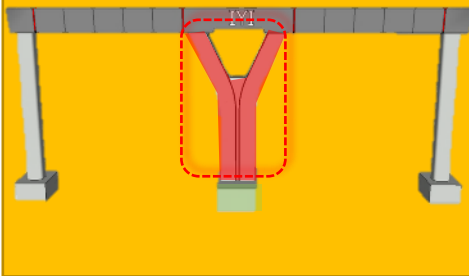

MLP01-22 ติดตั้ง Formwork Column Step2

ZONE 2

งานปรับพื้นที่
 ฝังขวาทาง
 (เกาะ Separator)

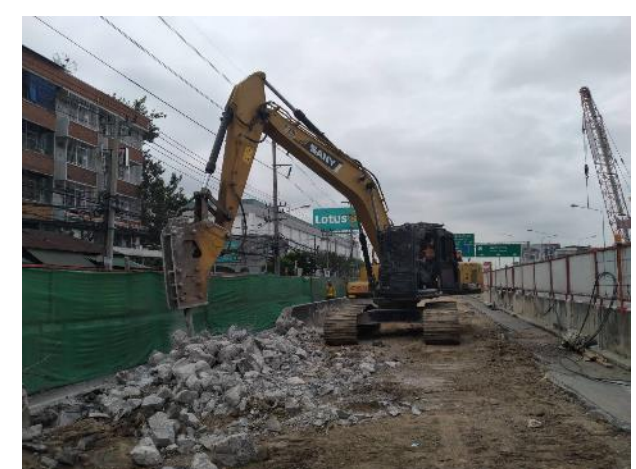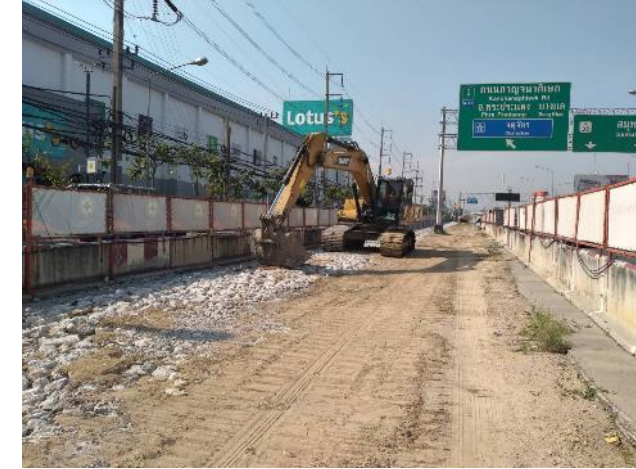


ZONE 2

งานปรับพื้นที่
ใต้ทางต่างระดับ
บางขุนเทียน



ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile

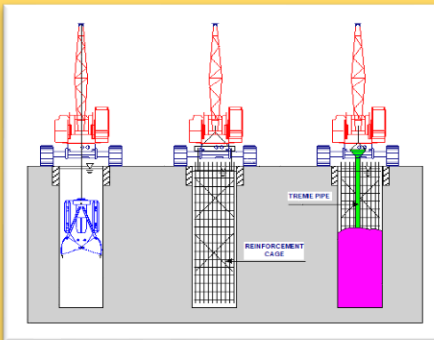

MLP4-05 Guide wall



MLP4-08L Guide wall




MLP4-06 Guide wall



MLP4-10L Guide wall

ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile

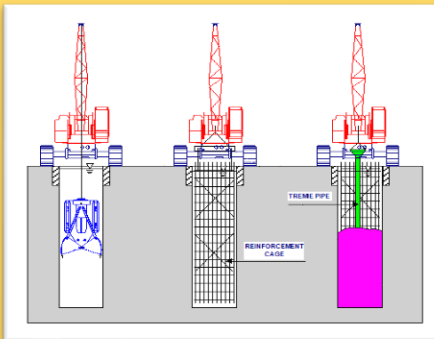

MLP4-11L Guide wall




MLP4-12 Guide wall



ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile

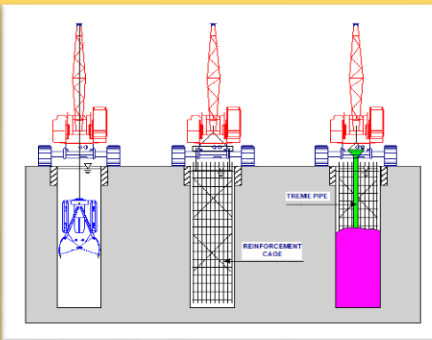

MLP4-04 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile




MLP04-04งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP04-04 งานเทคอนกรีต Barrette Pile

ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile

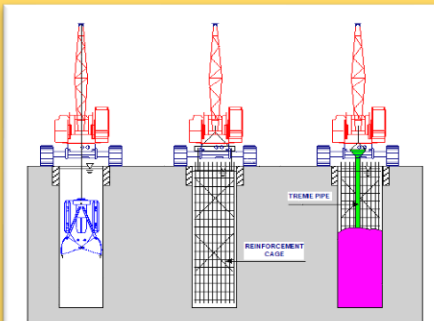

MLP03-22งานเจาะเสาเข็ม
Barrette Pile




MLP03-22 งานเทคอนกรีต
Barrette Pile



MLP03-22 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม

ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile

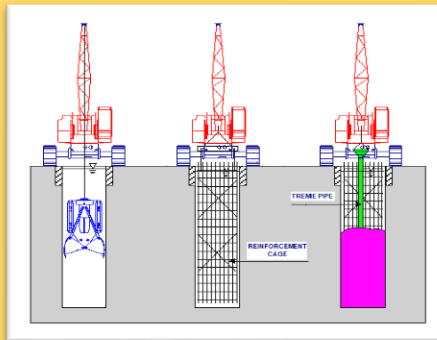

MLP4-05 งานเจาะเสาเข็ม
Barrette Pile




MLP04-05 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP04-14 งานเทคอนกรีต Barrette Pile

ZONE 2

งานก่อสร้าง Barrette Pile

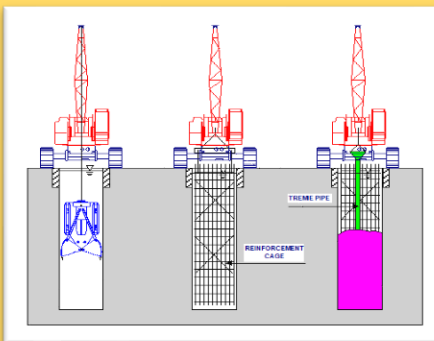

MLP3-25 งานเจาะเสาเข็ม
Barrette Pile



MLP4-02 งานเจาะเสาเข็ม
Barrette Pile




MLP03-22 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP03-27 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม

ZONE3



งานก่อสร้าง Barrette Pile

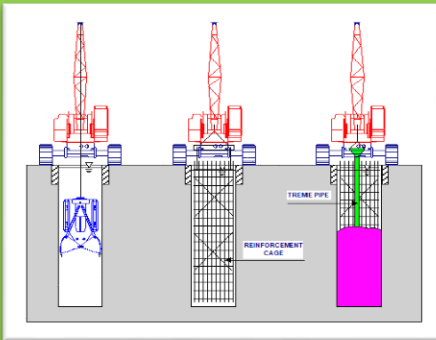

Sonic Logging Test Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-24L

ZONE3


งานก่อสร้าง Footing

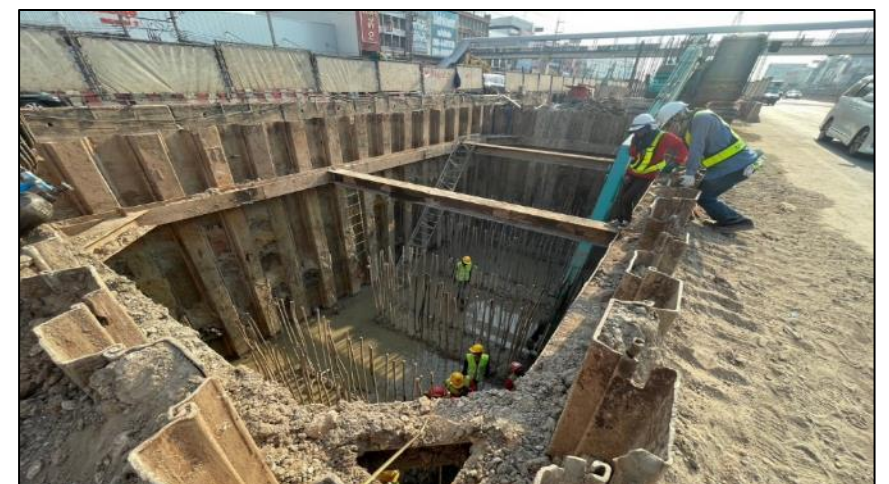

Pile Cut Off Footing 4F3.80x1.00 m. MLP04-22C

ZONE3



งานก่อสร้าง Footing



Install Steel Footing 2F3.00x1.00 m. MLP04-23C

ZONE3




งานก่อสร้าง Footing

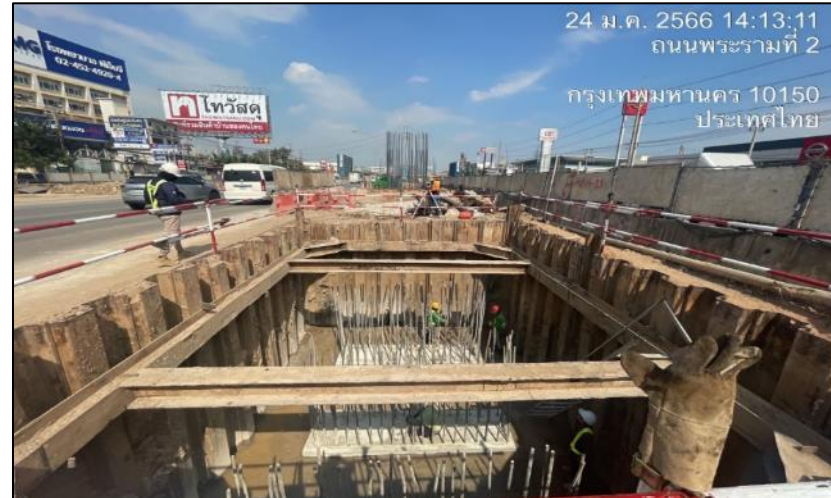

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP04-26C

ZONE3




งานก่อสร้าง Footing

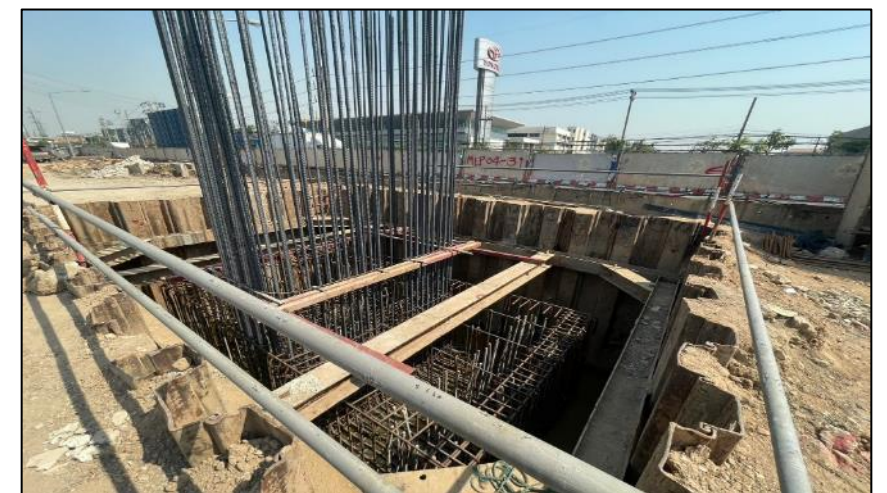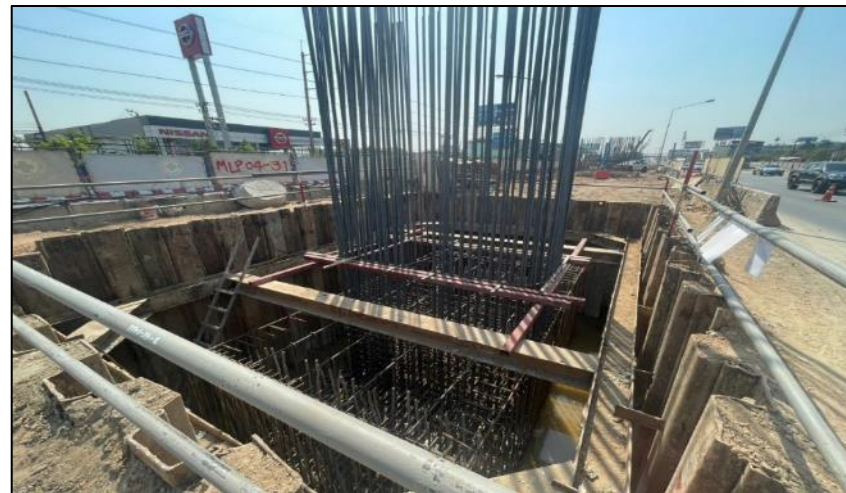

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP04-31C

ZONE3



งานก่อสร้าง Footing

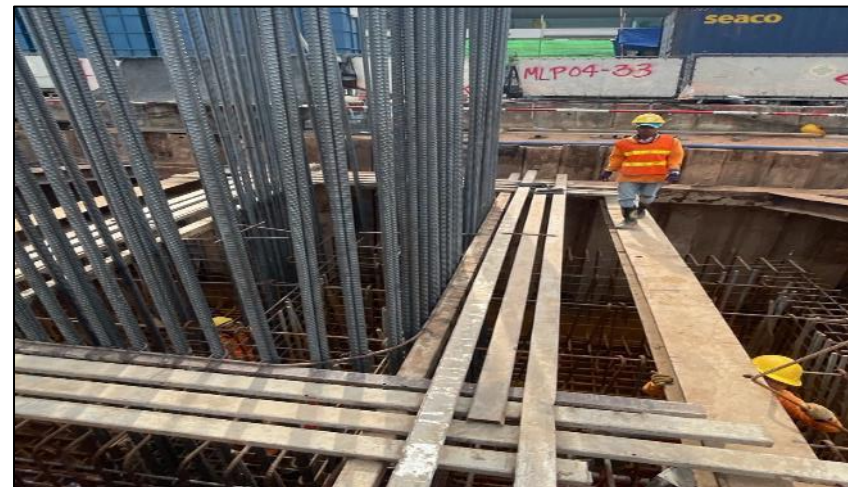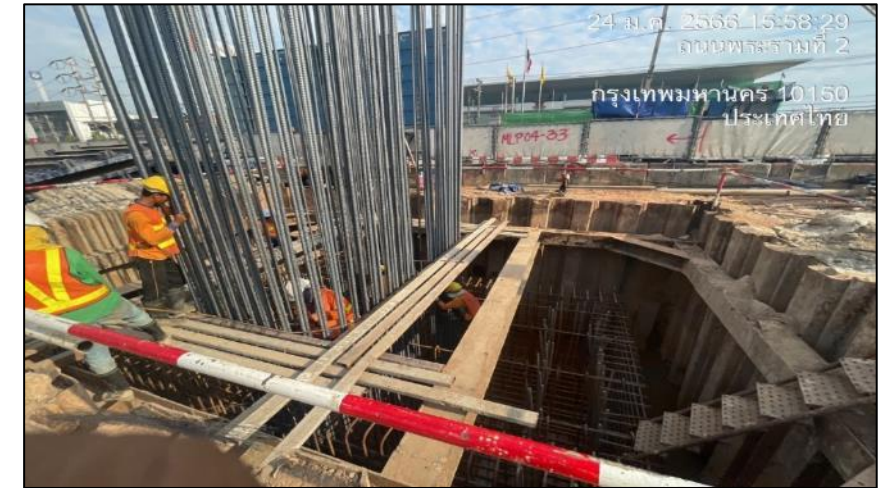

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP04-33C

ZONE3


งานก่อสร้าง
 Column

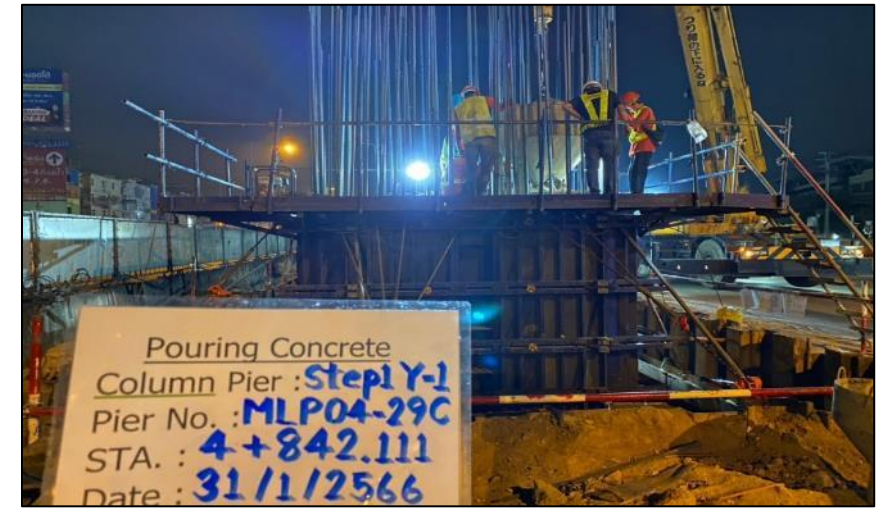

Install Formwork Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP04-29C

ZONE3

งานก่อสร้าง
Column



Install Formwork Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-01C

4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่กรมทางหลวง (ทล.)



การประชุมบูรณาการงานปรับปรุงผิวจราจรของแนวทางหลวงธนบุรี
 บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ร่วมกับแนวทางหลวงธนบุรี
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566



งานรื้อย้าย Barrier ของกรมทางหลวง บริเวณ Zone 2 ของโครงการฯ



งานรื้อย้าย Barrier ของกรมทางหลวง บริเวณ Zone 2 ของโครงการฯ



งานตัดสะพานคลองพระยาราชมนตรี

4.2.1 โครงสร้าง Retaining Wall บริเวณคลองสะแกงาม



ชุดสำรวจโครงสร้าง

4.2.2 การก่อสร้างบริเวณห้องน้ำสาธารณะใต้ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน



สำรวจแนวก่อสร้าง

สรุปสถานะงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

Update : 7 Feb 66

ลำดับ	หน่วยงานสาธารณูปโภค	สถานะการดำเนินงาน			
		(1) สำรวจแนวสาธารณูปโภค	(2) พิจารณาแนวทางการรื้อย้าย	(3) จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน	(4) รื้อย้ายสาธารณูปโภค
1	 การไฟฟ้านครหลวง (MEA)	✓	✓	✓	●
2	 การประปานครหลวง (MWA)	✓	✓	✓	●
3	 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	●
4	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)	✓	✓	✓	✓
5	 บริษัท ปตท. จำกัด (PTT)	✓	✓	ไม่มีการรื้อย้าย	

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ , ● = อยู่ระหว่างดำเนินการ , ✕ = ยังไม่ดำเนินการ

กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี

สถิติความปลอดภัย

SAFETY RECORD

ประจำเดือน มกราคม 2566



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

2	2	0	1	6	6
---	---	---	---	---	---

สถิติปัจจุบัน (10 ม.ค. 65 – 31 ม.ค.66)

Current Record

เป้าหมาย

Target

	1	0	4	3	2	3	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

	1	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

เราเคยมีจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The Best Record

	1	0	4	3	2	3	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours

สถิติตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (10 ม.ค.65 – 31 ม.ค.66)

Beginning to Present Record

	1	0	4	3	2	3	0
--	---	---	---	---	---	---	---

ชั่วโมงการทำงาน
Man hours
