

ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 5/2565 (ครั้งที่ 5 ของการดำเนินโครงการฯ)



ความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาตามสัญญา : 1020 วัน

ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว : 142 วัน (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Barrette Pile)
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี

12

รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน (Progress Photograph)

ZONE 1 (C)

งานเตรียมพื้นที่
สกัดโครงสร้างสะพาน
คลองแสนแสบ



ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile



MLP01-13 งาน Guide Wall



MLP01-06 งาน Guide Wall



MLP01-18 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile




MLP01-24งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-07 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile




MLP01-03 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

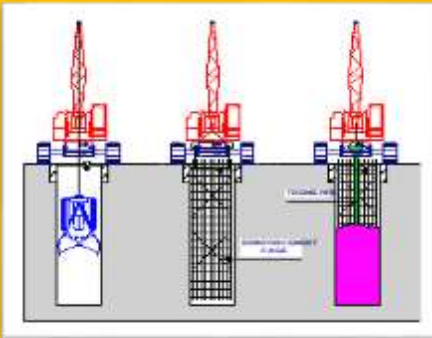

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

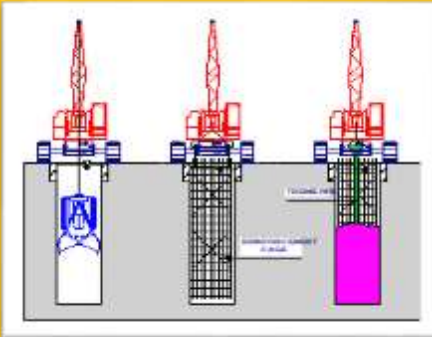

MLP01-05 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-03 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-09 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-11 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-05 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-03 งาน Drilling monitoring

ZONE 1 (C)

งานก่อสร้าง Barrette Pile




MLP01-03 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-03 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม



MLP01-05 งานเทคอนกรีต Barrette Pile

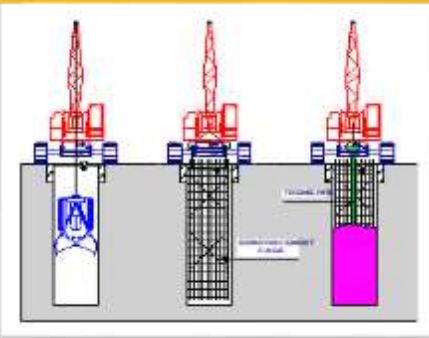

MLP01-20 งานเทคอนกรีต Barrette Pile




MLP01-24 งานเทคอนกรีต Barrette Pile



MLP01-09 งานเทคอนกรีต Barrette Pile

ZONE 1 (L)

งานก่อสร้าง Barrette Pile

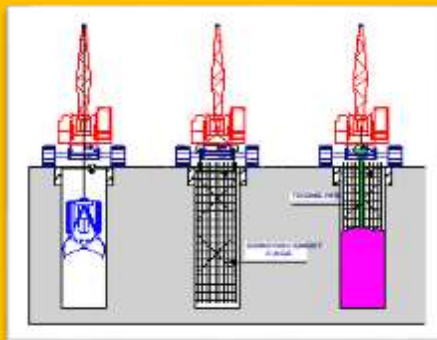

MLP01-05L งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-07L งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile



MLP01-07L งาน Drilling monitoring



MLP01-05L งาน Drilling monitoring



MLP01-07L ทำความสะอาดหลุมเจาะ
(De-sanding)



MLP01-07L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม

ZONE 2



งานวาง Barrier Concrete พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง กม.8+750 ถึง 9+000

ZONE 2



งานวาง Barrier Concrete พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง กม.9+000 ถึง 9+250

ZONE 2



งานวาง Barrier Concrete พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง กม.9+600 ถึง10+000

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-16C

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-17C

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP04-31C

ZONE 3



งานหล่อ Guide wall MLP06-02C

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-15C

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-15C-BP4

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-17C-BP1

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-17C-BP2

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-33C

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP04-34C

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP05-20C

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP05-21C

ZONE 3



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile MLP05-22C

ZONE 3



งาน Sonic logging test Barrette MLP05-05C/1,2,3

4.1) การประสานการเข้าใช้พื้นที่

4.1.1) กรมทางหลวง

งานรื้อย้าย Barrier ของกรมทางหลวง บริเวณเกาะ Separator



ZONE 3



งานรื้อถอน ป้าย OVERHEAD

4.2) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

สรุปความก้าวหน้างานสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2565

ที่	รายละเอียด
1	การไฟฟ้านครหลวง
	งานเจาะสำรวจแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV. จำนวน 8 หลุม
	1. MLP05-24 Sta. 5+903.090 (กม. 7+096.910) จำนวน 3 หลุม
	2. MLP05-03 – MLP05-04 Sta. 5+094.090 – Sta.5+129.090 (กม.7+905.910 – กม.7+870.91) จำนวน 5 หลุม
2	การประปานครหลวง (กปน.)
	งานขุดสำรวจแนวท่อประปาขนาด 1000 มม. จำนวน 8 จุด
	1. MLP04-18 Sta. 4+586.611 (กม. 8+413.389)
	2. MLP04-19 Sta. 4+600.611 (กม. 8+399.389)
	3. MLP04-20 Sta. 4+613.611 (กม. 8+386.389)
	4. MLP04-21 Sta. 4+633.611 (กม. 8+366.389)
	5. MLP04-22 Sta. 4+653.611 (กม. 8+346.389)
	6. MLP02-17 Sta. 2+609.091 (กม. 10+390.910)
	7. MLP04-05 Sta. 4+168.811 (กม.8+831.189)
	8. MLP05+25 Sta.5+943.090 (กม.7+056.910)

ที่	รายละเอียด
3	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	งานสำรวจแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน จำนวน 10 จุด
	1. MH#043- TOT MH#044 Sta. 5+650.00 – 5+450.00 (กม.7+350.00 – 7+550.00)
	2. MH#044 – MH#045 Sta. 5+450.00 – 5+290.00 (กม.7+550.00 – 7+710.00)
	3. MH#044 – PB#xxx Sta. 5+450.00 (กม.7+550.00)
	4. MH#042 - MH#043 Sta. 5+850.00 – 5+650.00 (กม.7+150.00 – 7+350.00)
	5. MH#043 - TOT MH#044 Sta. 5+650.00 – 5+450.00 (กม.7+350.00 – 7+550.00)
	6. MH#044 – MH#045 Sta. 5+450.00 – 5+290.00 (กม.7+550.00 – 7+710.00)
	7. MH#044 – PB#xxx Sta. 5+450.00 (กม.7+550.00)
	8. MH#045- TOT MH#046 Sta. 5+290.00 – 5+060.00 (กม.7+710.00 – 7+940.00)
	9. MH#045- TOT PB#002 Sta. 5+290.00 (กม.7+710.00)
	10. PB#025 - TOT PB#024 (NEW) Sta. 4+400.00 (กม.8+600.00)

4.2.1) การไฟฟ้านครหลวง


สรุปความก้าวหน้างานไฟฟ้า



ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	การไฟฟ้านครหลวง					
	Sta..2+675.00 – 2+775.00 (RT) (กม.10+325.000 – 10+225.00)	เสา-สายไฟฟ้า 69 kV.	ประชุมและสำรวจตำแหน่งเสา-สายไฟฟ้า 69 kV. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน , การทางพิเศษฯ , ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC			
	Sta.3+900.00 (LT) (กม.9+100.00)	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	อยู่ระหว่างประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการควบคุมงานปรับแบบรูป			
	Sta. 4+670.00 – 5+100.00 (LT) (กม.8+330.00 – 7+900.00)	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	อยู่ระหว่างการสำรวจแนวไฟฟ้าใต้ดินและจัดทำแบบรูปเพื่อขออนุญาต กฟน ดำเนินการ			
	Sta. 5+100.00 (Cross) (กม.7+900.00)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	สำรวจท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่ กทพ., ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง , กฟน. เขตบางขุนเทียน และ UN-CC (MLP05-03 to MLP05-04)			
	Sta.5+200.00 (กม.7+800.00)	ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV.	ประชุมและสำรวจหน้างานแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV. ใต้แนวสายส่ง EGAT และ การประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่องข้อควรระวังในการปฏิบัติงานก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน , การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบำรุงรักษาสายส่งใต้ดิน, การทางพิเศษฯ , ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC			
		งานเจาะสำรวจแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV.	-	8 หลุม	8 หลุม (แล้วเสร็จ100%)	



เจาะสำรวจแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV. บริเวณ MLP05-24 Sta. 5+903.090 (กม. 7+096.910)
 จำนวน 3 หลุม

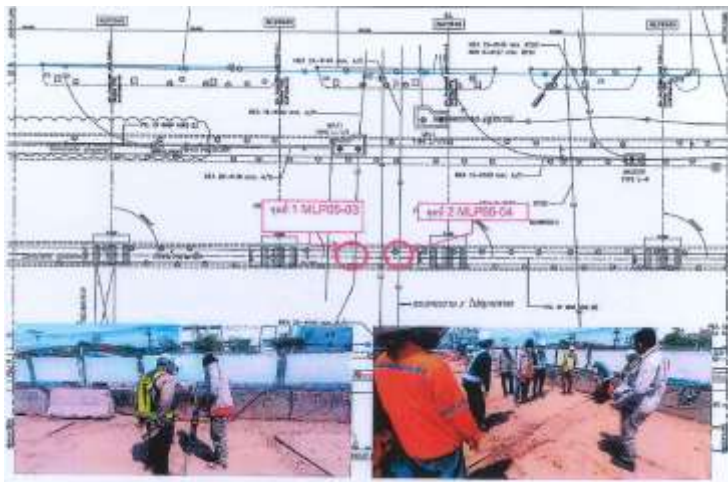

เจาะสำรวจแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV. บริเวณ MLP05-03 – MLP05-04 Sta. 5+094.090 – Sta.5+129.090 (กม.7+905.910 – กม.7+870.91) จำนวน 5 หลุม

4.2.2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูง



ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)		1. นำส่งแผนการก่อสร้างฐานราก สำหรับติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 2. ประชุมประสานงานเรื่องแผนการดับกระแสไฟฟ้าระหว่างงานเจาะเข็มฐานราก ได้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (ZONE 3) ร่วมกับการทางพิเศษฯ , ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC	-		
	Sta. 5+200.00 (Cross) (กม.7+800.00)	EGAT 230 kV. 2 วงจร				
	Sta. 5+200.00 (Cross) (กม.7+800.00)	EGAT 230 kV. 1 วงจร				



ประชุมหารือ เรื่อง รูปแบบฐานรากบริเวณ EGAT 01 ในวันที่ 19 พค 65 ระหว่าง กทพ. กฟน และผู้ให้บริการควบคุมงาน

4.2.3) การประปานครหลวง (กปน.)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปา



ที่	รายการ	จำนวน	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	การประปานครหลวง					
	งานออกแบบรื้อย้ายแนวท่อประปา ขนาด 1000 มม. Sta. 4+200.00 – 4+260.00 (RT) (กม.8+800.00 – 8+740.00)	1 จุด	อยู่ระหว่างการปรับแก้รูปแบบแนววาง ท่อประปา 1000 มม. บริเวณคลองลาด ลำภู เพื่อส่งผู้ให้บริการควบคุมงาน ก่อสร้าง พิจารณารูปแบบ	-	-	
	งานขุดสำรวจแนวท่อประปา Sta. 1+080.346 – 6+249.090 (กม.11+919.654 – 1+750.910)	78 จุด	49 จุด	8 จุด	57 จุด (73%)	คงเหลือ 21 จุด

ตำแหน่งจุดสำรวจแนวท่อประปาขนาด 1000 มม. ในโครงการ

No.	รายการสาธารณูปโภค	STA	กม.	PIER	ฝั่ง	เพื่องาน	Progress	ลำดับการ จุด	หมายเหตุ
1	ท่อประปา 1000 มม ST	1+080.346	11+919.654	MLP01-3	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
2	ท่อประปา 1000 มม ST	1+100.346	11+899.654	MLP01-4	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
3	ท่อประปา 1000 มม ST	1+120.346	11+879.654	MLP01-5	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
4	ท่อประปา 1000 มม ST	1+140.346	11+859.654	MLP01-6	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
5	ท่อประปา 1000 มม ST	1+160.346	11+839.654	MLP01-7	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
6	ท่อประปา 1000 มม ST	1+180.346	11+819.654	MLP01-8	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
7	ท่อประปา 1000 มม ST	1+200.346	11+799.654	MLP01-9	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
8	ท่อประปา 1000 มม ST	1+220.300	11+779.700	MLP01-10	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
9	ท่อประปา 1000 มม ST	1+240.253	11+759.747	MLP01-11	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
10	ท่อประปา 1000 มม ST	1+260.206	11+739.794	MLP01-12	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
11	ท่อประปา 1000 มม ST	1+280.159	11+719.841	MLP01-13	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
12	ท่อประปา 1000 มม ST	1+300.113	11+699.887	MLP01-14	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
13	ท่อประปา 1000 มม ST	1+320.066	11+679.934	MLP01-15	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
14	ท่อประปา 1000 มม ST	1+354.066	11+645.934	MLP01-16	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
15	ท่อประปา 1000 มม ST	1+388.066	11+611.934	MLP01-17	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
16	ท่อประปา 1000 มม ST	1+422.066	11+577.934	MLP01-18	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
17	ท่อประปา 1000 มม ST	1+456.066	11+543.934	MLP01-19	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
18	ท่อประปา 1000 มม ST	1+496.066	11+503.934	MLP01-20	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
19	ท่อประปา 1000 มม ST	1+536.066	11+463.934	MLP01-21	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
20	ท่อประปา 1000 มม ST	1+576.066	11+423.934	MLP01-22	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
21	ท่อประปา 1000 มม ST	1+614.566	11+385.434	MLP01-23	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
22	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	1+653.066	11+346.934	MLP01-24	RT	RAMP ROF1	สำรวจแล้ว	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
23	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	1+691.666	11+308.334	MLP01-25	RT	RAMP ROF1	อยู่ในงาน	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
24	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	1+730.166	11+269.834	MLP01-26	RT	RAMP ROF1	อยู่ในงาน	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
25	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	1+770.166	11+229.834	MLP01-27	RT	RAMP ROF1	จุดแล้วหาท่อไม่เจอ	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
26	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	1+810.166	11+189.834	MLP01-28	RT	RAMP ROF1	จุดแล้วหาท่อไม่เจอ	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
27	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	1+850.166	11+149.834	MLP01-29	RT	RAMP ROF1	อยู่ในลาดคอนกรีต	1	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
28	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+461.836	10+538.164	MLP02-13	RT	PIER TYPE IYI		3	ไม่สำรวจ
29	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+501.836	10+498.164	MLP02-14	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	3	ไม่สำรวจ
30	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+537.588	10+462.413	MLP02-15	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	3	ไม่สำรวจ
31	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+573.339	10+426.661	MLP02-16	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	3	ไม่สำรวจ
32	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+609.091	10+390.910	MLP02-17	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	3	ไม่สำรวจ
33	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+644.842	10+355.158	MLP02-18	RT	PIER TYPE IYI		3	ไม่สำรวจ
34	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	2+680.342	10+319.658	MLP02-19	RT	PIER TYPE IYI		3	ไม่สำรวจ
35	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+696.005	9+303.995	MLP03-21	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
36	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+736.005	9+263.995	MLP03-22	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
37	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+776.005	9+223.995	MLP03-23	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
38	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+816.005	9+183.995	MLP03-24	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ

No.	รายการสาธารณูปโภค	STA	กม.	PIER	ฝั่ง	เพื่องาน	Progress	ลำดับการ จุด	หมายเหตุ
39	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+856.005	9+143.995	MLP03-25	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
40	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+896.005	9+103.995	MLP03-26	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
41	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+936.005	9+063.995	MLP03-27	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
42	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	3+976.005	9+023.995	MLP03-28	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
43	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+016.011	8+983.989	MLP04-01	RT	PIER TYPE IYI		2	ไม่สำรวจ
44	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+054.211	8+945.789	MLP04-02	RT	PIER TYPE IYI		2	ไม่สำรวจ
45	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+092.411	8+907.589	MLP04-03	RT	PIER TYPE IYI		2	ไม่สำรวจ
46	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+130.611	8+869.389	MLP04-04	RT	PIER TYPE IYI		2	ไม่สำรวจ
47	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+168.811	8+831.189	MLP04-05	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
48	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+200.011	8+799.989	MLP04-06	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	อยู่ในแนวเขี่ย
49	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+239.210	8+760.790	MLP04-07	RT	PIER TYPE IYI	สำรวจแล้ว	2	อยู่ในแนวเขี่ย
50	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+266.411	8+733.589	MLP04-08	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
51	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+293.611	8+706.389		RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
52	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+333.611	8+666.389	MLP04-09	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
53	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+373.611	8+626.389	MLP04-10	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
54	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+413.611	8+586.389	MLP04-11	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
55	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+443.611	8+546.389	MLP04-12	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
56	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+473.611	8+506.389	MLP04-13	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
57	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+503.611	8+466.389	MLP04-14	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
58	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+533.611	8+426.389	MLP04-15	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	2	ไม่สำรวจ
59	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+553.611	8+446.389	MLP04-16	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ไม่สำรวจ
60	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+573.611	8+426.389	MLP04-17	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ไม่สำรวจ
61	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+586.611	8+413.389	MLP04-18	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ไม่สำรวจ
62	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+600.611	8+399.389	MLP04-19	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ไม่สำรวจ
63	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+613.611	8+386.389	MLP04-20	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ไม่สำรวจ
64	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+633.611	8+366.389	MLP04-21	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ไม่สำรวจ
65	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+653.611	8+346.389	MLP04-22	RT	RAMP RON2	สำรวจแล้ว	4	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
66	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+673.611	8+326.389	MLP04-23	RT	RAMP RON2		4	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
67	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+693.611	8+306.389	MLP04-24	RT	RAMP RON2		4	ชดเชยแบบพร้อมท่อประปา
68	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+723.611	8+276.389	MLP04-25	RT	RAMP RON2		4	ไม่สำรวจ
69	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+753.611	8+246.389	MLP04-26	RT	RAMP RON2		4	ไม่สำรวจ
70	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+783.611	8+216.389	MLP04-27	RT	RAMP RON2		4	ไม่สำรวจ
71	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+813.611	8+186.389	MLP04-28	RT	RAMP RON2		4	ไม่สำรวจ
72	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+842.111	8+157.889	MLP04-29	RT	RAMP RON2		4	ไม่สำรวจ
73	ท่อประปา 1000 มม ST&สี่สาลวดิน	4+870.611	8+129.389	MLP04-30	RT	RAMP RON2		4	ไม่สำรวจ
74	ท่อประปามา 1200 มม.	3+377.569	9+622.431	MLP03-11	CL	PIER TYPE PT-44	สำรวจแล้ว	5	ไม่สำรวจ
75	ท่อประปามา 300 มม.	4+473.611	8+526.389	MLP04-13	CL	PIER TYPE YI		5	ไม่สำรวจ
76	ท่อประปามา 1000 มม.	5+943.090	7+056.910	MLP05-25	CL	PIER TYPE Y-3	สำรวจแล้ว	5	ไม่สำรวจ
77	คูน้ำประปา 2500 มม.	6+209.090	6+790.910	MLP06-07	CL	PIER TYPE Y-1		5	ไม่สำรวจ
78	ท่อประปามา 300 มม.	6+249.090	6+750.910	MLP06-08	CL	PIER TYPE Y-1		5	ไม่สำรวจ

สำรวจแล้ว	49	จุด
ครั้งนี้	8	จุด
รวม	57	จุด
คงเหลือ	21	จุด

(คิดเป็นแล้วเสร็จ 73%)

งานชุดสำรวจท่อประปา ช่วงที่ 4 Sta. 4+554.000 – Sta. 4+871.000 จำนวน 15 จุด




MLP04-19



MLP04-21

สำรวจท่อประปาแล้วเสร็จ 7 จุด

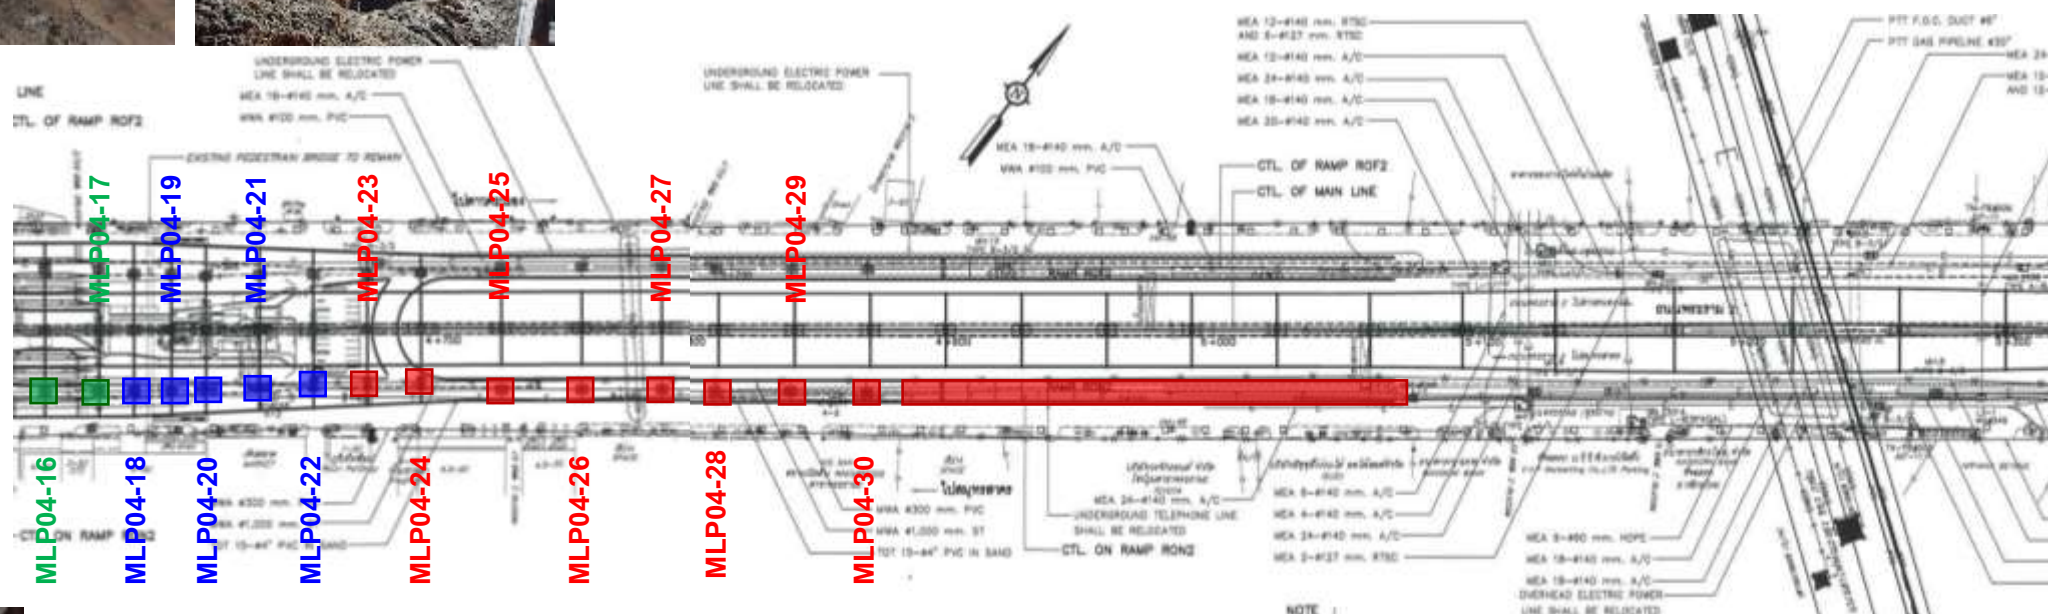

MLP04-18



MLP04-20




MLP04-22

- สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งที่แล้ว)
- สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งนี้ 5 จุด)
- ยังไม่ได้สำรวจ

งานขุดสำรวจท่อประปา ช่วงที่ 2 (Sta. 3+696.000 – Sta.4+534.000) กม.9+303.995 – กม.8+466.389 จำนวน 24 จุด

สำรวจท่อประปาแล้วเสร็จ 20 จุด

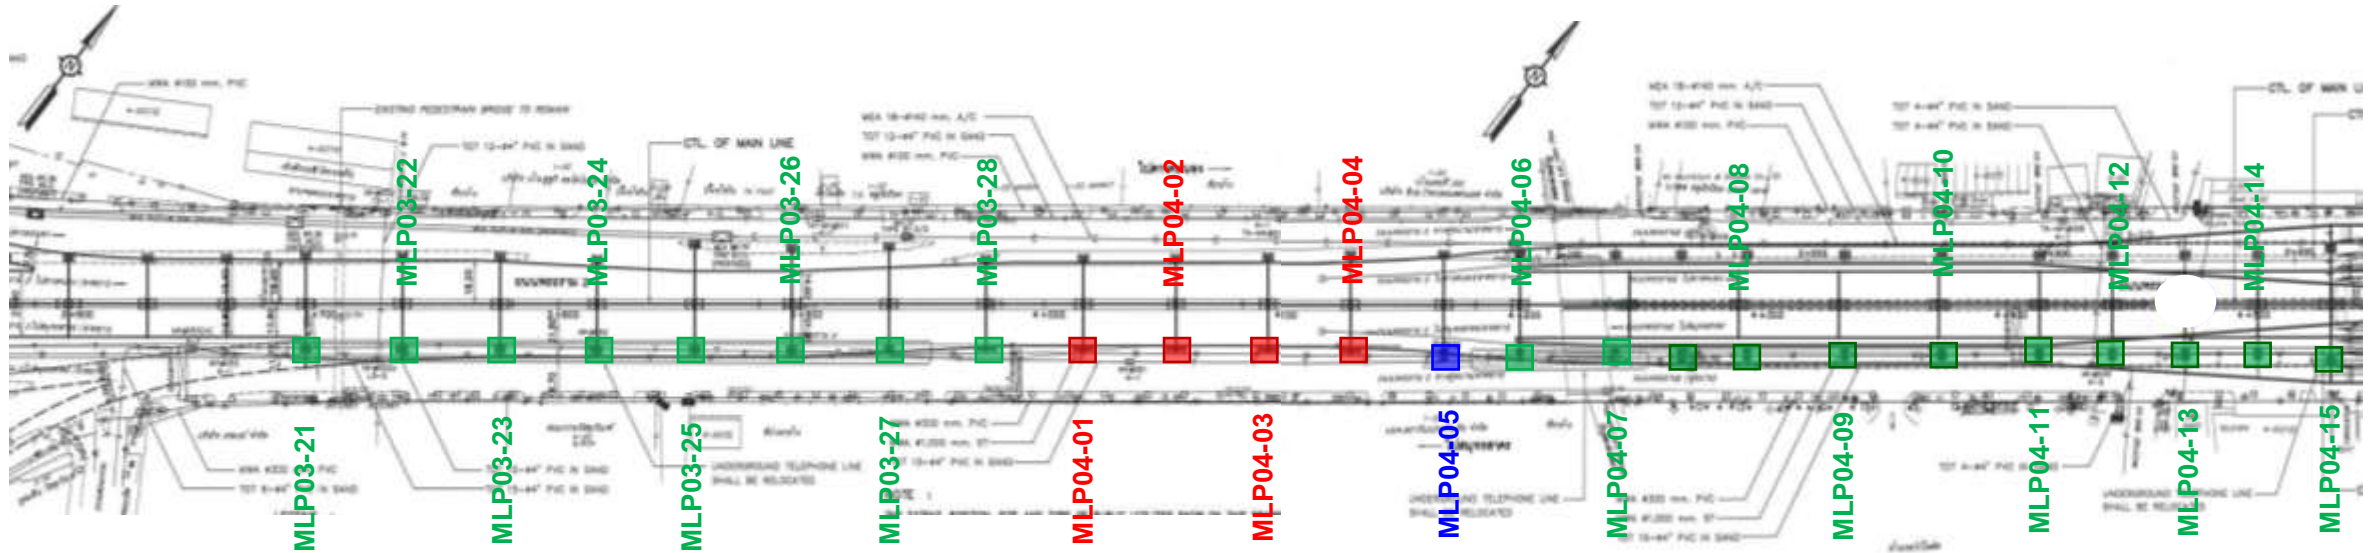


- สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งที่แล้ว)
- สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งนี้ 1 จุด)
- ยังไม่ได้สำรวจ



งานชุดสำรวจท่อประปา ช่วงที่ 3 Sta. 2+461.000 – Sta.2+681.000 กม.10+538.164 – กม. 10+319.658 จำนวน 7 จุด

สำรวจท่อประปาแล้วเสร็จ 4 จุด

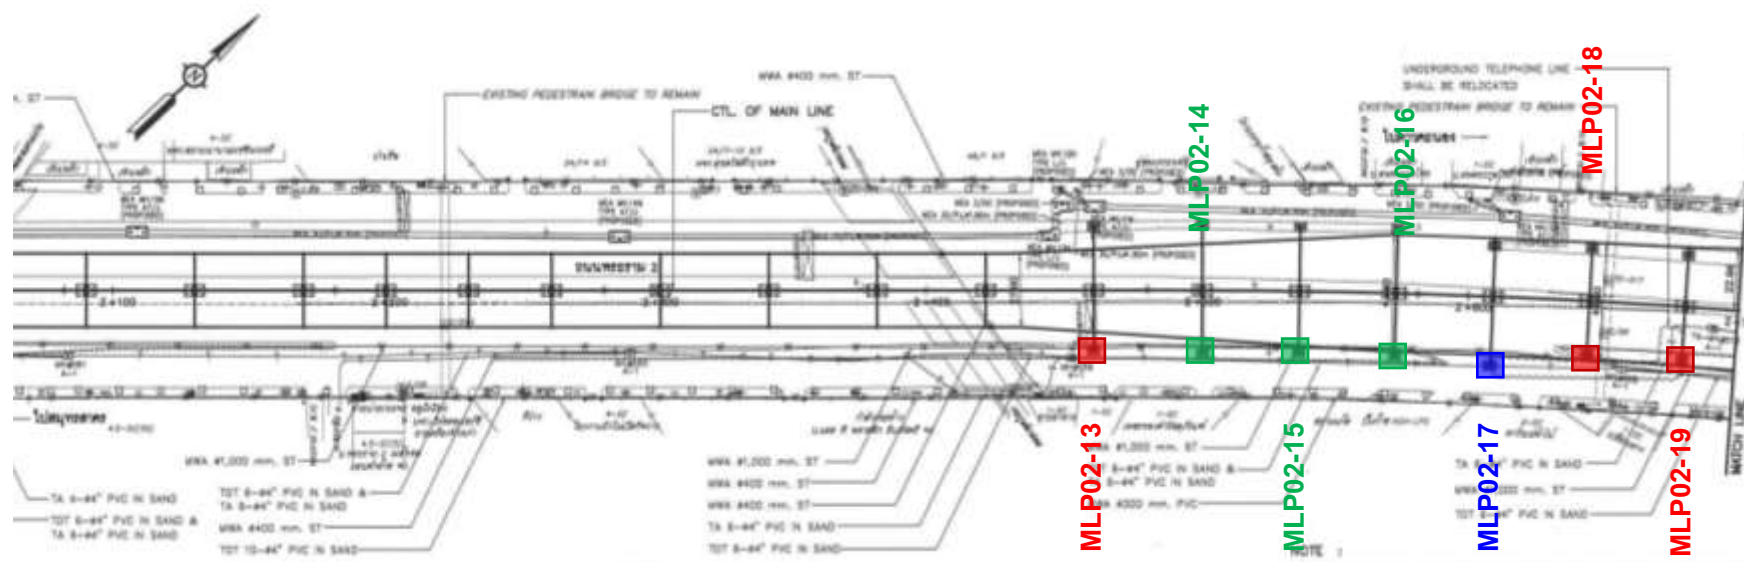

สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งที่แล้ว)


สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งนี้ 1 จุด)

ยังไม่ได้สำรวจ




งานชุดสำรวจท่อประปา ช่วงที่ 5 (Crossing) 5 จุด

สำรวจท่อประปาแล้วเสร็จ 2 จุด

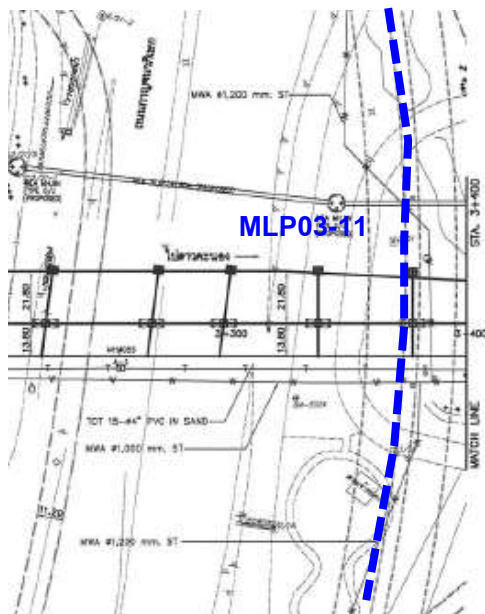


จุดที่ 1 Sta.3+377.569

กม. 9+622.431

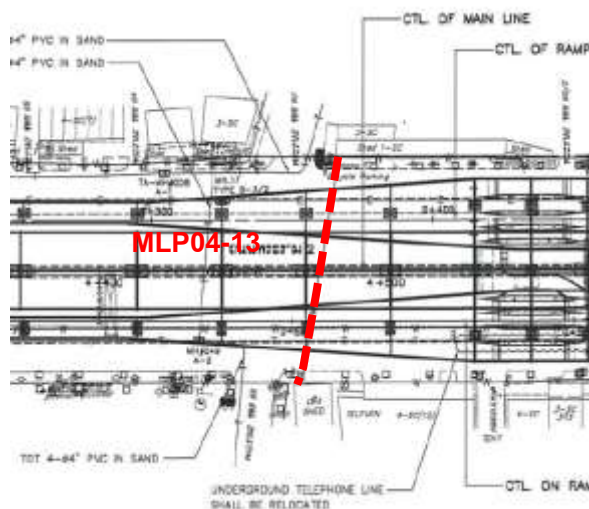


จุดที่ 2 Sta.4+473.611

กม.8+526.389

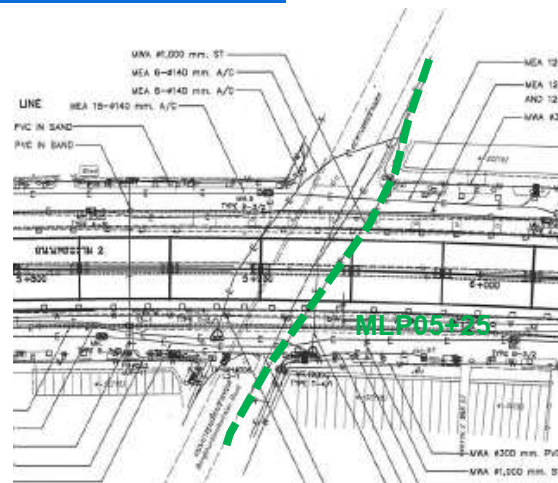

จุดที่ 3 Sta.5+943.090

กม.7+056.910

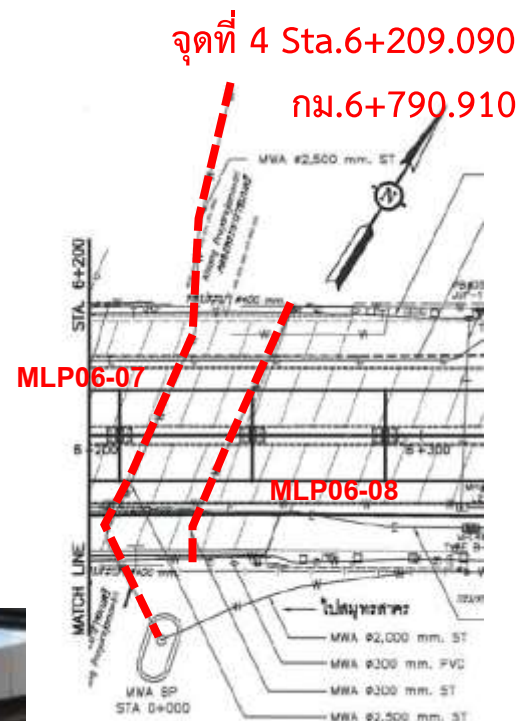

จุดที่ 4 Sta.6+209.090

กม.6+790.910

จุดที่ 5 Sta.6+249.090

กม.6+750.910

สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งที่แล้ว)

สำรวจแล้วเสร็จ (ครั้งนี้ 1 จุด)

ยังไม่ได้สำรวจ



4.2.4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อก๊าซ



ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					
	Sta. 5+240.00 (Cross) (กม.7+780.00)	แนวท่อก๊าซ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	

4.2.5) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สรุปสถานะ การดำเนินการรื้อย้ายเสา-สายสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 National Telecom Public Company Limited **TOT CAT**

ที่	รายการ	รายละเอียด	สถานะการดำเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค			หมายเหตุ
			ที่ผ่านมา	ครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	หน่วยงานสื่อสาร					
	Sta. 1+650.00 – 1+800.00 (RT) (กม.11+350.00 – 11+200.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 1+650.00 (Cross) (กม.11+350.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 2+500.00 – 2+900.00 (RT) (กม.10+500.00 – 10+100.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 3+650.00 – 5+100.00 (RT) (กม.9+350.00 – 7+900.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 3+720 (Cross) (กม.9+280.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 4+450 (Cross) (กม.8+550.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 6+130.00 (Cross) (กม.6+870.00)	ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน				
	Sta. 4+780.00 (Cross) (กม.8+220.00)	สายสื่อสารอากาศ				
	Sta. 4+300.00 – 4+400.00 (กม.8+700.00 – 8+600.00)	สำรวจแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน	12 จุด	10 จุด	22 จุด	
